




METROPOLITANA DI ROMA - LINEA C

Responsabile del Procedimento:

ing. Andrea Sciotti

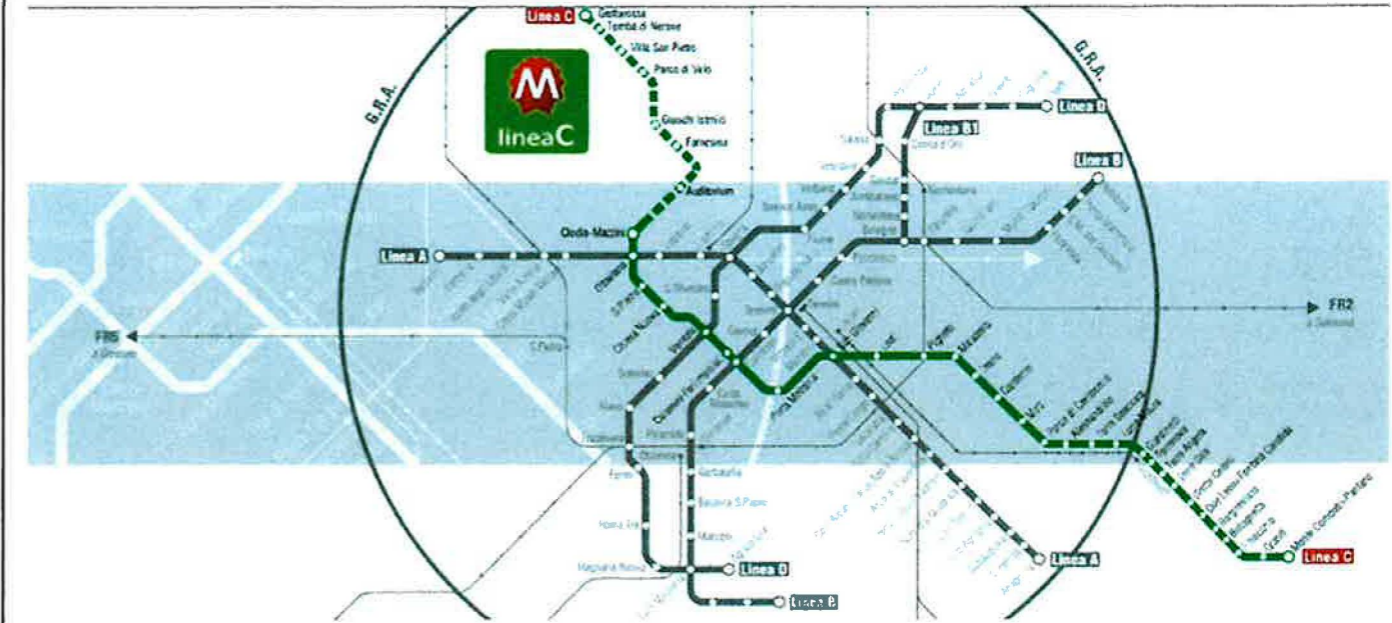

AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE

SOCIETA' DI PROGETTO: METRO C S.c.p.A.

DIRETTORE TECNICO

Ing. *F. P. Di Paola*
Albo Ing. Prov. RM n. 14713

DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Enrico Molinari
Albo Ing. Prov. RM n. 7761

RESPONSABILE DEI LAVORI

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Arch. Luigi Miozzi

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE

Ing. Luigi Antonio Gargiulo
Albo Ing. Prov. RM n. 14734

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE

Ing. *F. P. Di Paola*
Albo Ing. Prov. RM n. A-25413

TRATTA T1-T2 FARNESINA – VENEZIA

PROGETTO DEFINITIVO

PROGRAMMA MASTER

Rev.	data	descrizione	redatto	verificato	approvato	
-	19/12/2025	Emissione	E. Gabrielli	A. Paoluzzi	M. D'Angelo	F. P. Di Paola
a						
b						
c						

CODIFICA

scala	linea	tratta	fase	cat.	opera /impianto	argom./ area	elab.	tipo doc.	numero progr.	rev	
	C	X	G	D	X	Z X X	P X	S	B A	0 0 1	-

ID	Nome attività	Durata Giorni N.C.	T4	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	T1
				T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	T1 T2 T3 T4	
1	TRATTA TG FARNESINA - VENEZIA														
2	Iter approvativo Tratta T2	258													
3	Approvazione del I stralcio del Progetto Esecutivo da parte del RUP	0													
4	<i>Consegna aree ed Ordine di Servizio del RUP di inizio delle lavorazioni e forniture Tratta T2</i>	0													
5	Completamento redazione Progetto Esecutivo II stralcio da parte del Contraente Generale	0													
6	Approvazione del II stralcio del Progetto Esecutivo da parte del RUP	0													
7	Completamento redazione Progetto Esecutivo III stralcio da parte del Contraente Generale	0													
8	Approvazione del III stralcio del Progetto Esecutivo da parte del RUP	0													
9	Iter approvativo Tratta T1 e var. T2	463													
10	Ordinanza della Commissaria Straordinaria di approvazione del progetto definitivo Tratta T1 e Var. T2	0													
11	Ordine di servizio da parte del RUP di avvio della Progettazione Esecutiva	0													
12	Completamento redazione Progetto Esecutivo I stralcio da parte del Contraente Generale	0													
13	Approvazione del I stralcio del Progetto Esecutivo da parte del RUP	0													
14	<i>Consegna aree ed Ordine di Servizio del RUP di inizio delle lavorazioni e forniture Tratta T1</i>	0													
15	Completamento redazione Progetto Esecutivo II stralcio da parte del Contraente Generale	0													
16	Approvazione del II stralcio del Progetto Esecutivo da parte del RUP	0													
17	Completamento redazione Progetto Esecutivo III stralcio da parte del Contraente Generale	0													
18	Approvazione del III stralcio del Progetto Esecutivo da parte del RUP	0													
19	Tratta TG Farnesina - Venezia (da ID 4 a ID 71)	4078													
20	Gallerie TBM	1212													
21	Avvio scavo TBM	0													
22	Fine scavo TBM	0													
23	Smontaggio e via libera	100													
24	Gallerie in tradizionale	775													
25	Avvio scavo gallerie in tradizionale	0													
26	Fine scavo gallerie in tradizionale	0													
27	Pozzo Volpi	3226													
28	Costruzione pozzo	2751													
29	Finiture e sistemazioni esterne	249													
30	Attrezzaggio pozzo	294													
31	Stazione Farnesina	3439													
32	Costruzione stazione	3050													
33	Finiture e sistemazioni esterne	414													
34	Attrezzaggio stazione	354													
35	Stazione Auditorium	3410													
36	Costruzione stazione	3021													
37	Finiture e sistemazioni esterne	469													
38	Attrezzaggio stazione	379													
40	Pozzo Flaminio	2941													
41	Costruzione pozzo	2506													
42	Finiture e sistemazioni esterne	434													
43	Attrezzaggio pozzo	314													
44	Stazione Clodio/Mazzini	3570													
45	Costruzione stazione	3023													
46	Finiture e sistemazioni esterne	546													
48	Attrezzaggio stazione	427													
49	Stazione Ottaviano	3575													
50	Costruzione stazione	3271													
51	Finiture e sistemazioni esterne	414													
52	Attrezzaggio stazione	385													
53	Stazione San Pietro	3588													
54	Costruzione stazione	3175													
55	Finiture e sistemazioni esterne	442													
56	Attrezzaggio stazione	377													
57	Stazione Chiesa Nuova	3590													
58	Costruzione stazione	3245													
59	Finiture e sistemazioni esterne	464													
60	Attrezzaggio stazione	355													
61	Linea	1222													
62	Costruzione linea	682													
63	Attrezzaggio linea	726													
64	PROVE di sottosistema, interfaccia ed integrazione impianti	300													
65	MIS ATC	90													
66	FINE COSTRUZIONE	0													
67	Prove Preventive Funzionali (di Sistema)	60													
68	Prove funzionali con Enti certificatori	60													
69	Preesercizio del Contraente Generale	60													
70	Emissione del CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI	0													
71	CONSEGNA DELLA LINEA a Roma Metropolitana e per essa all'Esercente (EX ART. 200 DPR 554/99)	0													
